

KADIKÖY

BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
BETON VE ZEMİN LABORATUARI
BETON BASINÇ DAYANIM TEST RAPORU
(EN 12390-3)

Bölüm No
DökümanNo
Yür. Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No

Yapı Sahibi / Proje Adı	LERZAN TUNA VE HİSS.		
Müteahhit Firma	GÖKÖZ İNŞAAT		
Yapı Adresi	CAFERGA MAH. / Rıza Paşa Sokak		
Parsel / Ada / Pafta	28	1116	34
Num.Alan.Tek.	ERDİNÇ ARAL		
İrsaliye No	264168-187-189		



NUMUNE BİLGİLERİ

Alındığı Tarih	16-09-2015	Numunenin Ait Olduğu Yapı	TEMEL BETONU
Lab Geliş Tarihi	17-09-2015		
Numune Adedi	9	Çökme (Slump) mm	15-16
Beton Sınıfı	C35	Ortam Sıcaklığı	26
Numunenin Tipi	KÜP	Beton Sıcaklığı	26
Dökülen Beton Miktarı	100	Alınış Saati	11:00-15:30
Beton Firması	DENİZ YAPI(MİLTAS)	Numunenin Bakım Tarzı	KÜRLEME

YAPILAN DENEY SONUÇLARI

7 GÜNLÜK						28GÜNLÜK					
Deney Tarihi		23-09-2015				Deney Tarihi		14/10/2015			
Rapor Tarihi						Rapor Tarihi					
Sayfa No						Sayfa No					
Rapor No						Rapor No					
No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3	No	Basınç Dayanımı MPa	Birim Ağırlık gr/cm3
1	29.7	2.404	7			1	43.5	2.388	7		
2	30.6	2.409	8			2	42.2	2.377	8		
3	30.4	2.408	9			3	46.4	2.384	9		
4			10			4	44.9	2.386	10		
5			11			5	41.0	2.380	11		
6			12			6	45.6	2.391	12		
ORT		30.2				ORT		43.9			

Yükleme Hızı : 0.6 MPa/sn.

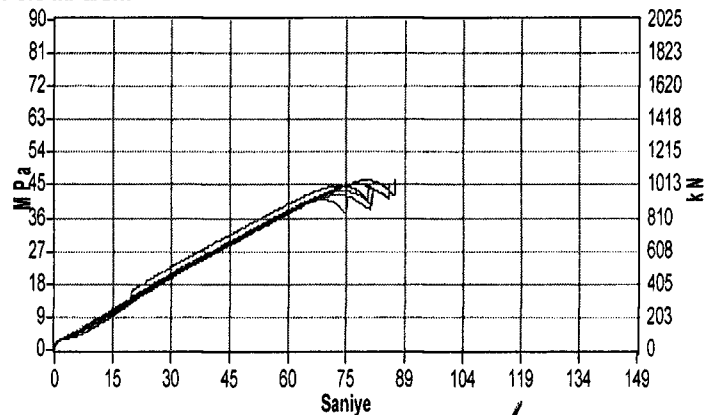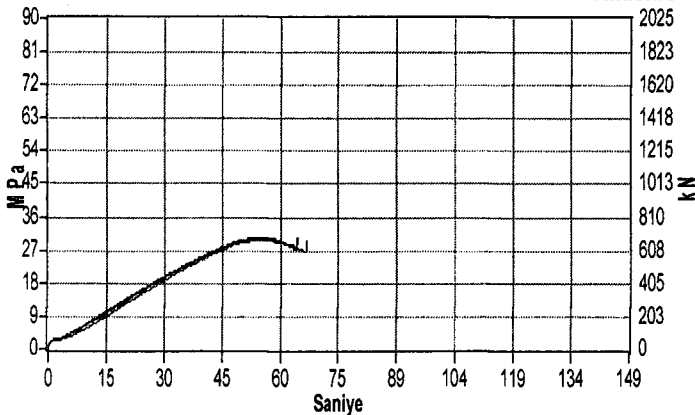

Serdar YILDIZ

45
