



CONTROL İNŞ.YAPI MALZEMELERİ LABORATUVAR
HİZMETLERİ VE SAN.TİC.LTD.ŞTİ
Basınç Dayanım raporu



Numune Bilgileri :

Yapı Sahibi : FİKRET KESKİN VE HISS.
İnşaat Adresi : CAFERAĞA MH. HASIRCIBASI CD.NO:72 KADIKÖY

Yapı Denetim : İLKE YAPI DENETİM A.Ş. BAKANLIĞI Pafta / Ada / Parsel : 19/69/30

Katkı : Beton Cinsi : C35
Test Standardı : Hazır Beton : BOĞAZIÇI BETON

Kull. Yer : 8.NORMAL KAT KOLON BERDE TABLİYE

Rapor No : B5555-17
Rapor Tarihi : 15.01.2018


Nr.	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık gr.	Büyük Ağırlık kg/dm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Basınç Dayanımı N/mm ²	Beton Sıcaklığı °C	Transmikser No
1	225.00	3375.00	8095.00	2.40	28	18/12/17	15/01/18	1049.43	46.64		
2	225.00	3375.00	8088.00	2.40	28	18/12/17	15/01/18	1083.42	48.15		
3	225.00	3375.00	8078.00	2.39	28	18/12/17	15/01/18	1058.08	47.03		
4	225.00	3375.00	8070.00	2.39	28	18/12/17	15/01/18	1083.88	48.17		
5	225.00	3375.00	8077.00	2.39	28	18/12/17	15/01/18	1085.27	48.23		
6	225.00	3375.00	8071.00	2.39	28	18/12/17	15/01/18	1080.02	48.00		

Ortalama : 1073.35 47.70

Deney Grafiği

Basınç Dayanımı (N/mm²)

Kırılma Yüğü (kN)

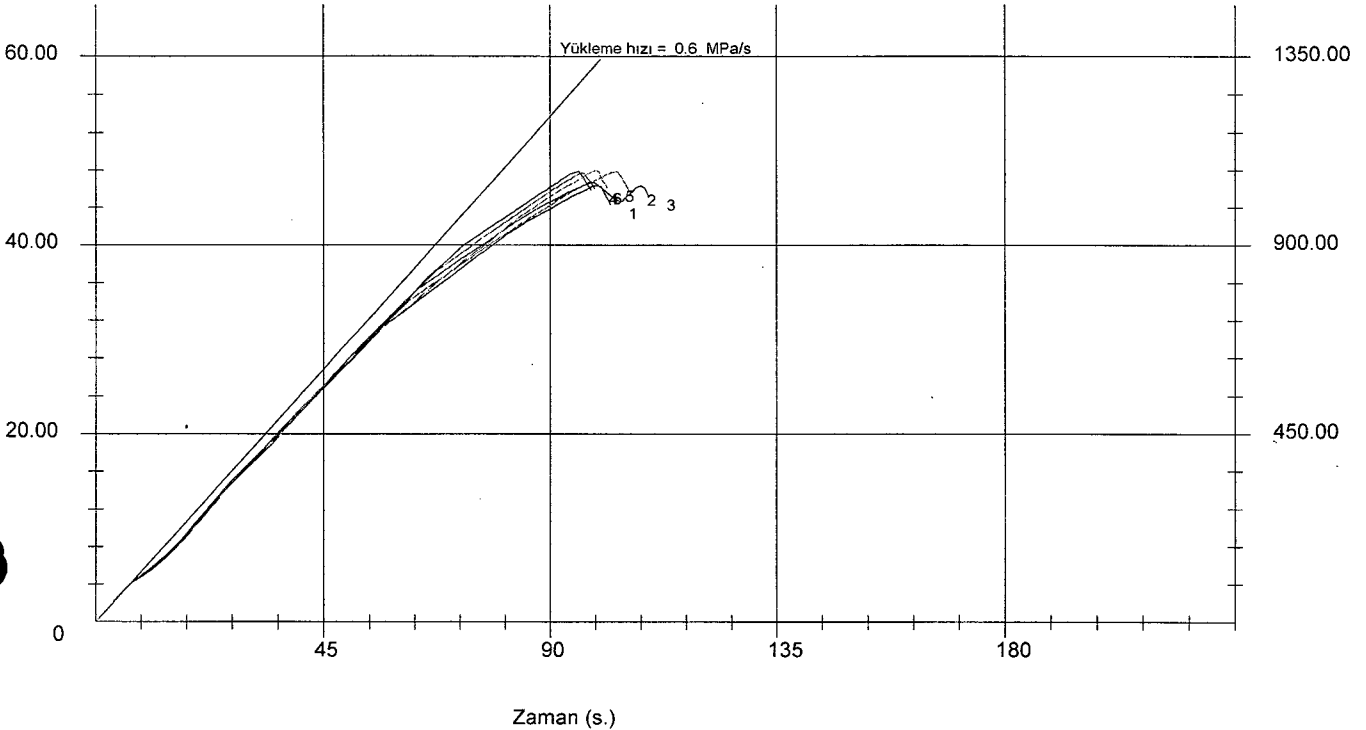

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan

E. Sarıgül İnş.teknisyeni

Onaylayan

Murat Kabadayı Den.Müh.(12381)

Kayıt yeri : C:\Users\Win 7\Desktop\BETON17\5555-281.tst

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.
